

行政院農業委員會水土保持局臺南分局 會勘紀錄

會勘事由：為本分局執行之高雄市茂林區「扇平林道 4.8K、往鳳崗林道上下邊坡排水及扇平二號橋上下游野溪災害復建工程(111-ADE-36-4-001)」辦理施工便道協調現勘。

貳、會勘時間：111 年 5 月 31 日（星期二）上午 10 時 30 分

參、會勘地點：工地現址

肆、會勘人員：

行政院農業委員會林務局屏東林區管理處：林孚瑞技正

行政院農業委員會林業試驗所六龜研究中心：朱榮三站長

剴盛工程顧問有限公司：曹祥竣

啟輝營造有限公司：陳隨意

水保局臺南分局：許哲源、洪志祥課長

其他：盛暉營造有限公司-陳麗玲

其他：勇霖工程顧問有限公司-杜永昌

其他：

其他：

伍、會勘結論：

林務局意見：儘量維持可通行空間供人車機具出入。

水土保持局臺南分局結論：

一、現因林試所進行疏伐木清運作業(約至 6 月中)及房舍修繕作業(約至 7 月底)

，與林務局執行「扇平林道 0K~3.3K 道路改善工程」(含箱涵及道路等工項，

工期約 180 日曆天)，均與旨揭工程出入道路(扇平林道)重疊。

二. 本分局經與監造單位及施工廠商檢討後，目前工區一及工區二均與上述林試

所與林務局執行工程動線重疊，另工區二現因梅雨季節連日豪雨造成河道水

位上漲，無任何可施工項目。

三. 建議本分局執行之”扇平林道 4.8K、往鳳崗林道上下邊坡排水及扇平二號橋

上下游野溪災害復建工程”自 111 年 5 月 25 日(開工日起)先行停工，俟林試

所及林務局相關工程執行進度至可供本分局施工機具及人車通行且互不影響之

階段(約 111 年 7 月 31 日)後再進場施工，停工期間辦理展延工期，以符實際

狀況。(以下空白)

陸、散會(上午 11 時 05 分)

行政院農業委員會水土保持局臺南分局 會勘紀錄

會勘事由：為本分局執行之高雄市茂林區「扇平林道 4.8K、往鳳崗林道上下邊坡排水及扇平二號橋上下游野溪災害復建工程(111-ADE-36-4-001)」辦理施工便道協調現勘。

貳、會勘時間：111年5月31日(星期二)上午10時30分

參、會勘地點：工地現址

肆、會勘人員：

行政院農業委員會林務局屏東林區管理處：林厚端

行政院農業委員會林業試驗所六龜研究中心：朱榮三

剴盛工程顧問有限公司：曹翔竣

啟輝營造有限公司：叶吐意

水保局臺南分局：許哲源 洪志輝

其他：盛輝營造有限公司 陳麗玲

其他：勇霖工程顧問有限公司 王永昌

其他：.....

其他：.....

伍、會勘結論：

林務局意見：盡量維持可通行空間供人車機具出入。

水土保持局臺南分局結論：

一、現因林試所進行疏伐木清運作業(約至6月中)及房舍修繕

作業(約至月底),與林務局執行"扇平林道0K~3.3K道路改

善工程”(含箱涵及道路等工項,工期約180日曆天),均與
自揭工程出入道路(扇平林道)重疊。

二.本分局經與監造單位及施工廠商檢討後,目前工區一及工
區二均與上述林試所與林務局執行工程重疊,另工區二現
因梅雨季節連日豪雨造成河道水位上漲,無任何可施作項目。

三.建議本分局執行之“扇平林道4.8K、往鳳崗林道上下邊坡排水及
扇平二號橋上下游野溪災害復建工程”自111年5月25日(開工日起)
先行停工,俟林試所及林務局相關工程執行進度至可供本分局
施工機具及人事通行且互不影響之階段(約111年7月31日)後再
進場施工,停工期間辦理展延工期,以符實際狀況。(以下空白)

陸、散會(上午11時05分)

抄 本

檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會水土保持局臺南分局 會勘通知單



受文者：如出列席單位及人員

發文日期：中華民國111年5月26日
發文字號：水保南治字第1112027285號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

會勘事由：為本分局執行111年度整體性治山防災計畫—治山防災(土砂災害防治)—高雄市茂林區「扇平林道4.8K、往鳳崗林道上下邊坡排水及扇平二號橋上下游野溪災害復建工程(111-ADE-36-4-001)」辦理施工便道協調會勘(已電話先行通知)，請相關單位及人員務必撥冗出席。

會勘時間：111年5月31日(星期二)上午10時30分

會勘地點：假高雄市政府警察局六龜分局森山檢查所集合前往工地現址

主持人：洪課長志祥

聯絡人及電話：許哲源(承辦人員) 06-2684367#4219

出席者：行政院農業委員會林務局屏東林區管理處、行政院農業委員會林業試驗所六龜研究中心、劉盛工程顧問有限公司、啟輝營造有限公司

列席者：

副本：本分局治理課

備註：

- 一、旨揭工程開工日期：111年5月25日，工程期限300日曆天。
- 二、現因施工期間唯一施工出入道路-扇平林道，目前有林業試驗所辦理疏伐作業運輸疏伐木、及道路修繕作業(預計工期約至111年7月底)。
- 三、另林務局屏東林區管理處執行「扇平林道0K~3.3K道路改善工程」案(開工日期約111年5月24日，工程期限200日曆天)。



四、由於出入便道重疊，恐造成施工進度延宕，因此辦理本次施工便道協調會勘，惠請相關單位召集施工廠商及監造單位辦理會勘協調。

裝

訂

線

扇平林道 4.8K、往鳳崗林道上下邊坡排水及扇平二號橋上下游野溪災害復建工程

111.05.31 施工便道協調會勘照片




會勘照片



會勘照片



1. 林務局施工位置

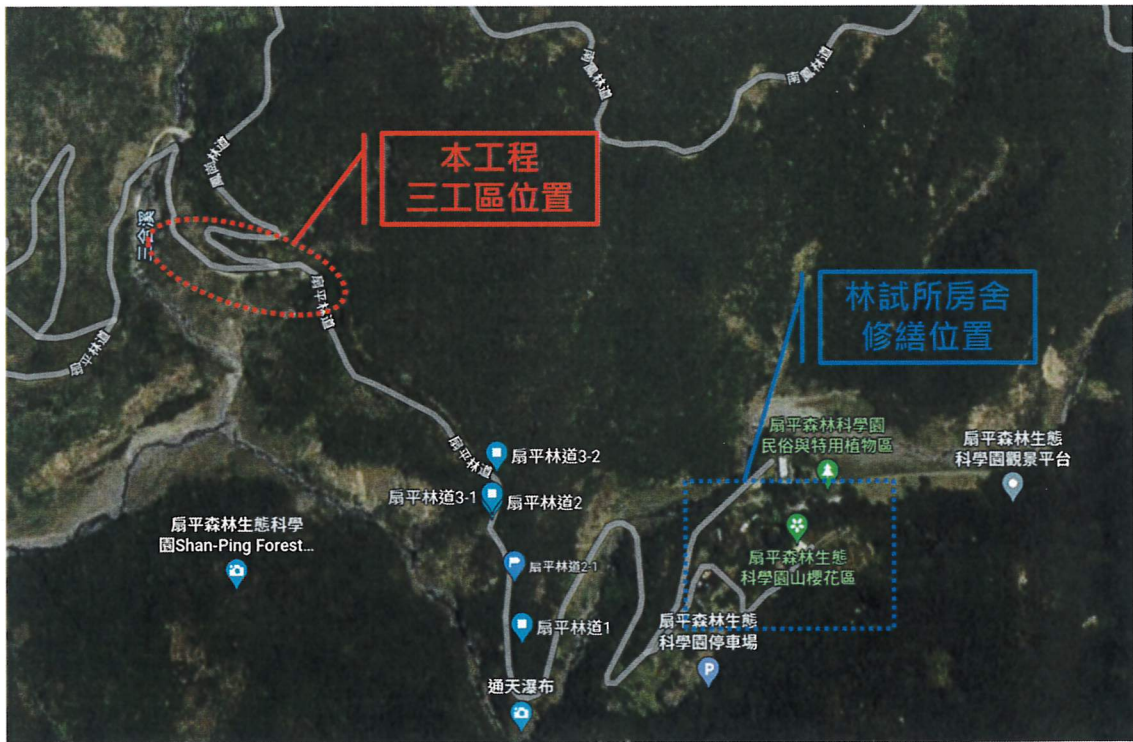

2 林試所房舍修繕位置及本分局三工區施工位置圖



2. 林試所疏伐木清運動線與本分局三工區位置

